공약목표	지역은 더욱 풍요롭게

Ⅰ-9	역사문화관광 콘텐츠 발굴						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2029 (임기내)	사업성격	신규	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 문화유산 탐방로 개선으로 대중의 접근성 향상

○ 역사문화유산에 대한 새로운 관람환경 조성으로 군민 관심도 향상

□ 사업개요

○ 추진근거: 국가유산기본법 제4조

○ 사업기간: 2027 ~ 2029

○ 사업위치: 이정구묘~이천보고가, 상색리 마을회관~중종대왕태봉

○ 사업규모: 탐방로 구축 2개소

○ 총사업비: 200백만원(군비 100%)

○ 사업내용

- 탐방로 구축: 200백만원
  - 이천보, 이정구, 영창대군 태실 등 태봉리~연하리 구간(약2㎞) 역사인물 탐방로 조성
  - 상색리 마을회관~중종대왕태봉 구간(약1㎞) 조선왕실 태실로 조성
  - 마을 탐방로 경관 조경, 산책로 조성 등 안전 보행로 확보로 관람 접근성 확보

○ 사업의 필요성

- 접근성과 경관성이 부족한 관내 문화유산의 탐방로를 조성하여 접근성 향상 및 관람환경 개선 필요

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
탐방로 경관조성 제작설치 제안서 평가			■								■								
탐방로: 조성공사 및 설치				■	■							■	■						

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	200		200		50		150		
국비									
도비									
군비	200		200		50		150		
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
탐방로 조성	개소	2	-	1	-	1	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
탐방로 조성	-		1		-		1		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 민선9기 공약사업 추진계획(역사문화 콘텐츠 발굴) 수립: 2026. 8. 14.

□ 기대효과

○ 탐방로 개설을 통한 관람환경 개선으로 신규 관광객 유치로 지역경제 활성화 도모

○ 주민참여예산 제안사업(탐방로 개설)과의 연계로 지역주민 만족도 상승

주관부서	문화체육과 문화유산팀	담당자	최근락 (☎2063)

문화유산 탐방로 구축

1. 역사인물 탐방로



이천보고가 위치도(시작점)



이정구선생묘 위치도(도착점)

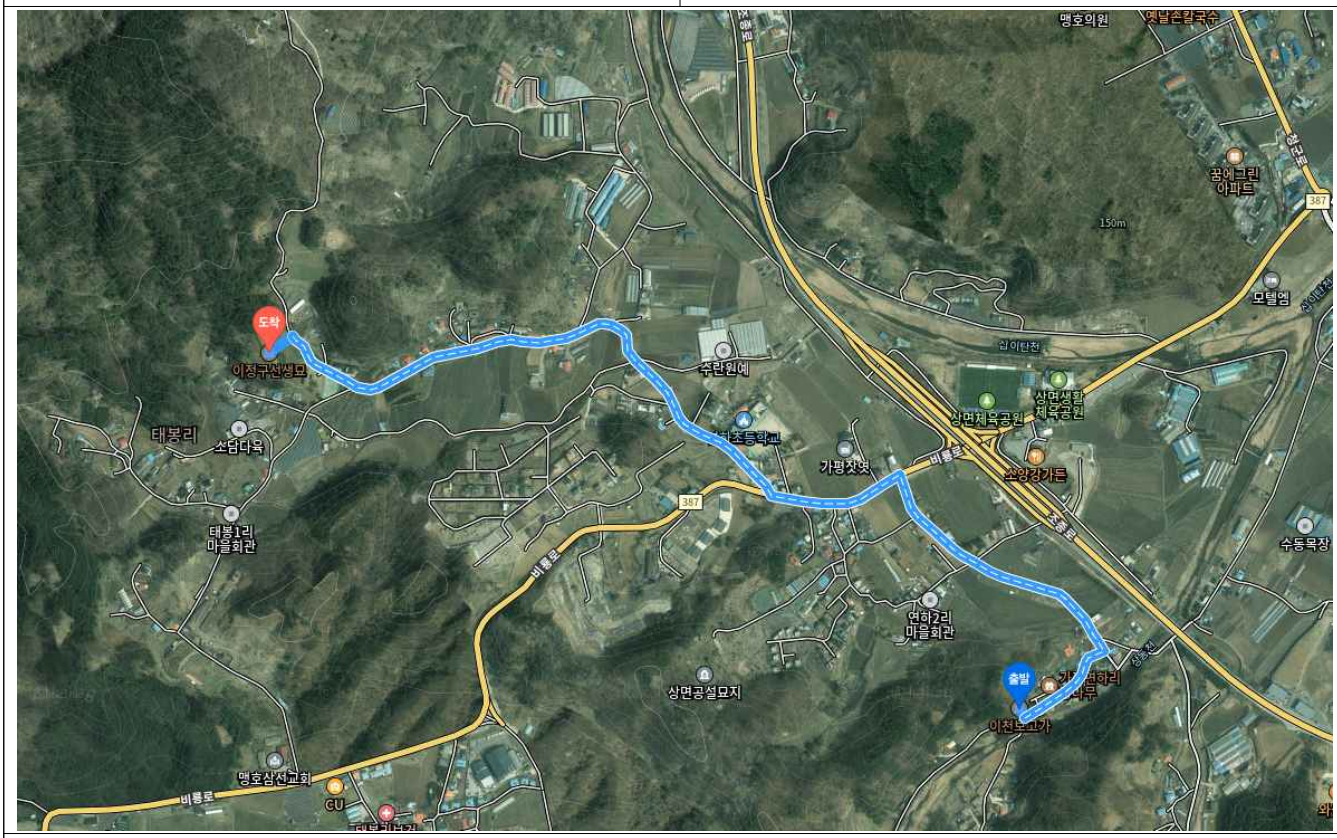

전체 경로







구축 예정 시설

2. 조선왕실 태실로

상색리 마을회관 위치도(시작점) ~ 중종대왕 태봉(도착점)



전체 경로

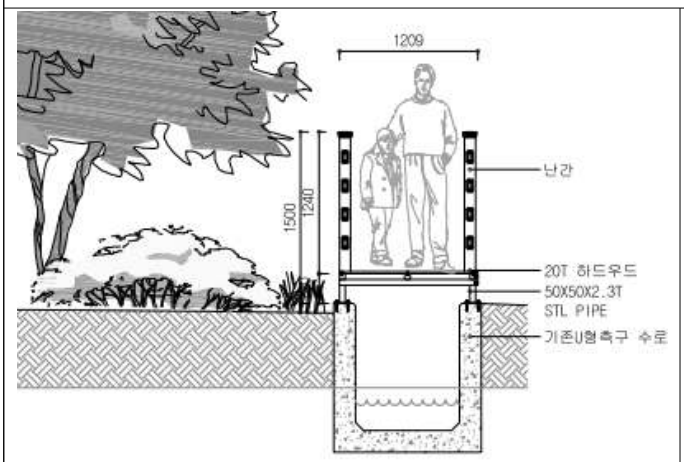









구축 예정 시설
